

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE OBRAS					
 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/03/2024		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FORTE	VERBOS	HORA
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE	2,00	111,53%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027,1 COM DESPESERACAO	47,00%
			SINAPI	2023/09 COM DESPESERACAO	84,44%
			Composições Proprias	PROPRIA	0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 13,9200	R\$ 0,4176
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 20,2400	R\$ 3,2384
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,3700	R\$ 0,4110
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 18,2900	R\$ 2,1948
TOTAL Material:					R\$ 6,2618

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,64800000	R\$ 16,7700	R\$ 10,8670
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,64800000	R\$ 20,7700	R\$ 13,4590
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,3260

VALOR:	R\$ 30,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,59
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 24,33
VALOR MATERIAL:	R\$ 6,26
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 7,50
VALOR COM BDI:	R\$ 38,09

14.6.1. C2473 PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,3700	R\$ 0,3768
11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,04400000	R\$ 32,3300	R\$ 1,4225
12093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,20900000	R\$ 40,3400	R\$ 8,4311
TOTAL Material:					R\$ 10,2304

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,05670000	R\$ 16,7700	R\$ 0,9509
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,10530000	R\$ 20,7700	R\$ 2,1871
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,1380

VALOR:	R\$ 13,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,90
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,37
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 3,14
VALOR MATERIAL:	R\$ 10,23
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 3,28
VALOR COM BDI:	R\$ 16,65

14.6.2. C2040 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,3700	R\$ 0,3768
11735 PRIMER A BASE DE EPOXI	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 42,9500	R\$ 5,6694
11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 32,3300	R\$ 1,0669

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA:	11/08/2023	BDI: 24,52%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FONTE:	VENIO	HORA: 70,00%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE:	2023/09	111,93%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESENERAÇÃO	47,75%
			SINAPI:	2023/09 COM DESENERAÇÃO	47,75%
			Composições Proprietárias:	PROPRIA	0,00%

TOTAL Material: R\$ 7,1131

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,03240000	R\$ 16,7700	R\$ 0,5433
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,06480000	R\$ 20,7700	R\$ 1,3459
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,8892

VALOR:	R\$ 9,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,00
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,88
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,12
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 2,21
VALOR COM BDI:	R\$ 11,21

15.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 7,3700	R\$ 1,1055
I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 8,5300	R\$ 0,5971
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 20,2400	R\$ 2,4288
I1872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 67,0100	R\$ 10,0515
I2036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 14,2600	R\$ 14,9730
I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	R\$ 57,5300	R\$ 157,0569
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 18,2900	R\$ 1,8290
TOTAL Material:					R\$ 188,0418

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40500000	R\$ 16,7700	R\$ 6,7919
I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,72900000	R\$ 16,7700	R\$ 12,2253
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,21500000	R\$ 20,7700	R\$ 25,2356
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,2528

VALOR:	R\$ 232,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 26,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 232,29
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 44,25
VALOR MATERIAL:	R\$ 188,04
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 56,96
VALOR COM BDI:	R\$ 289,25

15.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 18,0700	R\$ 0,3614
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,3614

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA : 11/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FONTE	VERSÃO	PREÇO
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE	2023	111,83%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM RECONSTRUÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/09 COM RECONSTRUÇÃO	47,76%
			Composições Próprias	PROPRIAS	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 7,7000	R\$ 10,3950
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 8,1400	R\$ 0,1628
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 60,5200	R\$ 2,4208
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 19,2900	R\$ 19,2900
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,4500	R\$ 7,8120
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 59,8600	R\$ 5,3874
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,5900	R\$ 0,2518
TOTAL Material:					R\$ 45,7198

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,64800000	R\$ 20,7700	R\$ 13,4590
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,56700000	R\$ 20,7700	R\$ 11,7766
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24300000	R\$ 20,7700	R\$ 5,0471
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,89100000	R\$ 15,5500	R\$ 13,8551
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,1378

VALOR:	R\$ 90,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 27,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 90,22
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 44,44
VALOR MATERIAL:	R\$ 45,78
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 22,12
VALOR COM BDI:	R\$ 112,34

15.3. C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6224 ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 105,9700	R\$ 105,9700
TOTAL Material:					R\$ 105,9700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40500000	R\$ 20,7700	R\$ 8,4119
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40500000	R\$ 15,5500	R\$ 6,2978
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,7097

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 84,8100	R\$ 50,8860
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 5,0000	R\$ 6,2500
C0782 CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 13,5400	R\$ 16,9250
C1212 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 24,9700	R\$ 31,2125
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 33,3800	R\$ 3,0042
TOTAL Serviço:					R\$ 108,2777

VALOR:	R\$ 228,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 57,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2020		BDI: 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FONTE:	VERSA	Rúbrica	
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE	2023/09	83,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONER	47,76%	
			SINAPI	2023/09 COM DESONER	84,44%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 228,96
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 91,56
VALOR MATERIAL:	R\$ 137,40
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 56,14
VALOR COM BDI:	R\$ 285,10

15.4. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.840,2300	R\$ 2.840,2300
TOTAL Material:						R\$ 2.840,2300

VALOR:	R\$ 2.840,23
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.840,23
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 2.840,23
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 696,42
VALOR COM BDI:	R\$ 3.536,65

15.5. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.724,2700	R\$ 1.724,2700
TOTAL Material:						R\$ 1.724,2700

VALOR:	R\$ 1.724,27
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.724,27
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 1.724,27
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%):	R\$ 422,79
VALOR COM BDI:	R\$ 2.147,06

15.6. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.532,1600	R\$ 1.532,1600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2023			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FONTE	VERSÃO	HOR	MES
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DECOMUNICAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2023/09 COM DECOMUNICAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.021,3100	R\$ 1.021,3100
					TOTAL Material:	R\$ 2.553,4700

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	R\$ 272,0900	R\$ 23,5358
					TOTAL Serviço:	R\$ 23,5358

VALOR:	R\$ 2.577,01
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 5,90
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.577,01
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 2.567,76
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 631,88
VALOR COM BDI:	R\$ 3.208,89

15.7. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 60,5200	R\$ 0,0303
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,4500	R\$ 0,0675
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 157,1700	R\$ 157,1700
					TOTAL Material:	R\$ 157,2678

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,81000000	R\$ 20,7700	R\$ 16,8237
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20250000	R\$ 20,7700	R\$ 4,2059
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28350000	R\$ 15,5500	R\$ 4,4084
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,4380

VALOR:	R\$ 182,71
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 15,51
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 182,71
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 25,44
VALOR MATERIAL:	R\$ 157,27
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 44,80
VALOR COM BDI:	R\$ 227,51

15.8. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 307,1900	R\$ 307,1900
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORÇAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,7500	R\$ 19,0000
					TOTAL Material:	R\$ 326,1900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,62000000	R\$ 20,7700	R\$ 33,6474

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2023			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FORTE:	VERG:	H:	MES:
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE:	2023	11,53%	70,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESEMPENHO	2023/06 COM DESEMPENHO	84,44%
			SINAPI:	2023/06 COM DESEMPENHO	84,44%	47,16%
			Composição Própria:	PRÓPRIA:	0,00%	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32400000	R\$ 15,5500	R\$ 5,0382
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,8856
					VALOR:	R\$ 364,88
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 23,51
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 364,88
					VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 38,89
					VALOR MATERIAL:	R\$ 326,19
					VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
					VALOR BDI (24,62%):	R\$ 89,47
					VALOR COM BDI:	R\$ 454,35

15.9. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Materiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 60,5200	R\$ 0,2421
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 0,4800
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 17,1600	R\$ 12,8700
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 20,2400	R\$ 1,6192
11582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 1,5000
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 18,2900	R\$ 1,2803
				TOTAL Material:		R\$ 18,4416

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,89100000	R\$ 16,7700	R\$ 14,9421
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,64800000	R\$ 20,7700	R\$ 13,4590
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,89100000	R\$ 20,7700	R\$ 18,5061
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16200000	R\$ 15,5500	R\$ 2,5191
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 49,4263

VALOR:	R\$ 67,87
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 30,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 67,87
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 49,43
VALOR MATERIAL:	R\$ 18,44
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,62%):	R\$ 16,64
VALOR COM BDI:	R\$ 84,51

15.10. C4641 SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18640	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA	SEINFRA	M2	0,02250000	R\$ 388,9500	R\$ 8,7514
					TOTAL Material:	R\$ 8,7514

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,16200000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3647
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,16200000	R\$ 15,5500	R\$ 2,5191

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 WJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2023
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	VERBA: 2023/09
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE: 027.1 COM DESGASTO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SINAPI: 2023/09 COM DESGASTO



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,8838
VALOR:	R\$ 14,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,64
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 5,88
VALOR MATERIAL:	R\$ 8,75
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.82%):	R\$ 3,59
VALOR COM BDI:	R\$ 18,23

15.11. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06075000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,9447

VALOR:	R\$ 0,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 0,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,94
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,94
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.82%):	R\$ 0,23
VALOR COM BDI:	R\$ 1,17


FRANCISCO
WILTON UCHOA
NOGUEIRA:83994
629349

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
WILTON UCHOA
NOGUEIRA:839946293
49

CARLOS
AUGUSTO
MORAIS
FERREIRA
GOMES:1233049
3304

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO MORAIS
FERREIRA
GOMES:12330493
304

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA : 11/06/2024		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FORTE	VERSÃO	111,93% 70,07%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE	2023/09	83,65% 47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	0,00% 0,00%
			SINAPI	2023/09 COM DESONERACAO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

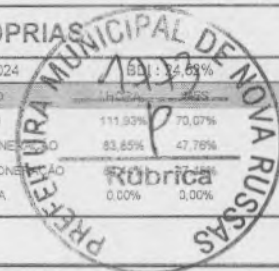

COM-16026174 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	4,53800000	R\$ 3.455,45
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	4,50360000	R\$ 16.547,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 90.196,12
VALOR:					R\$ 90.196,12
VALOR ENCARGOS (47,48%):					R\$ 29.037,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 90.196,12
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 90.196,12
VALOR MATERIAL:					R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%):					R\$ 22.116,09
VALOR COM BDI:					R\$ 112.312,21

COM-57017221 REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO (UN) (UNID)

Materia	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	0,10000000	R\$ 0,68
I13793	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.286,93
TOTAL Material:					R\$ 1.287,00
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,81000000	R\$ 16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,81000000	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,40
VALOR:					R\$ 1.317,40
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 18,50
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.317,40
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 30,40
VALOR MATERIAL:					R\$ 1.287,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%):					R\$ 323,03
VALOR COM BDI:					R\$ 1.640,43

FRANCISCO
WILTON
UCHOA
NOGUEIRA:839
94629349

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
WILTON UCHOA
NOGUEIRA:839946
29349

CARLOS
AUGUSTO
MORAIS
FERREIRA
GOMES:123304
93304

Assinado de
forma digital por
CARLOS
AUGUSTO
MORAIS FERREIRA
GOMES:12330493
304

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA:	11/06/2024	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	PONTE	VERSÃO	NOVA	RES
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE	2023/09	111,83%	70,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	007.1 COM DE SONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SENAPI	2023/09 COM DE SONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Condições Financeira	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 222.066,67	R\$ 18.498,15	R\$ 18.498,15	R\$ 18.498,15	R\$ 18.498,15	R\$ 18.498,15	R\$ 18.498,15	R\$ 18.498,15	R\$ 18.498,15	R\$ 18.498,15
2	COBERTURA METÁLICA	R\$ 773.476,70	R\$ 64.430,61	R\$ 64.430,61	R\$ 64.430,61	R\$ 64.430,61	R\$ 64.430,61	R\$ 64.430,61	R\$ 64.430,61	R\$ 64.430,61	R\$ 64.430,61
3	COBERTURA VESTIÁRIO	R\$ 23.270,36	R\$ 1.938,42	R\$ 1.938,42	R\$ 1.938,42	R\$ 1.938,42	R\$ 1.938,42	R\$ 1.938,42	R\$ 1.938,42	R\$ 1.938,42	R\$ 1.938,42
4	ARQUIBANCADAS	R\$ 228.807,14	R\$ 19.067,96	R\$ 19.067,96	R\$ 19.067,96	R\$ 19.067,96	R\$ 19.067,96	R\$ 19.067,96	R\$ 19.067,96	R\$ 19.067,96	R\$ 19.067,96
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO-VESTIÁRIOS	R\$ 273.057,18	R\$ 22.746,50	R\$ 22.746,50	R\$ 22.746,50	R\$ 22.746,50	R\$ 22.746,50	R\$ 22.746,50	R\$ 22.746,50	R\$ 22.746,50	R\$ 22.746,50
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 284.635,72	R\$ 23.710,16	R\$ 23.710,16	R\$ 23.710,16	R\$ 23.710,16	R\$ 23.710,16	R\$ 23.710,16	R\$ 23.710,16	R\$ 23.710,16	R\$ 23.710,16
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 65.714,17	R\$ 5.473,99	R\$ 5.473,99	R\$ 5.473,99	R\$ 5.473,99	R\$ 5.473,99	R\$ 5.473,99	R\$ 5.473,99	R\$ 5.473,99	R\$ 5.473,99
8	PISOS	R\$ 402.255,11	R\$ 33.507,85	R\$ 33.507,85	R\$ 33.507,85	R\$ 33.507,85	R\$ 33.507,85	R\$ 33.507,85	R\$ 33.507,85	R\$ 33.507,85	R\$ 33.507,85
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 48.181,55	R\$ 4.013,52	R\$ 4.013,52	R\$ 4.013,52	R\$ 4.013,52	R\$ 4.013,52	R\$ 4.013,52	R\$ 4.013,52	R\$ 4.013,52	R\$ 4.013,52
10	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 21.794,67	R\$ 1.815,50	R\$ 1.815,50	R\$ 1.815,50	R\$ 1.815,50	R\$ 1.815,50	R\$ 1.815,50	R\$ 1.815,50	R\$ 1.815,50	R\$ 1.815,50
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 74.027,09	R\$ 6.166,46	R\$ 6.166,46	R\$ 6.166,46	R\$ 6.166,46	R\$ 6.166,46	R\$ 6.166,46	R\$ 6.166,46	R\$ 6.166,46	R\$ 6.166,46
12	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-PCIP	R\$ 9.607,92	R\$ 800,34	R\$ 800,34	R\$ 800,34	R\$ 800,34	R\$ 800,34	R\$ 800,34	R\$ 800,34	R\$ 800,34	R\$ 800,34
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-SPDA	R\$ 35.830,65	R\$ 2.984,69	R\$ 2.984,69	R\$ 2.984,69	R\$ 2.984,69	R\$ 2.984,69	R\$ 2.984,69	R\$ 2.984,69	R\$ 2.984,69	R\$ 2.984,69
14	PINTURA	R\$ 150.319,36	R\$ 12.521,60	R\$ 12.521,60	R\$ 12.521,60	R\$ 12.521,60	R\$ 12.521,60	R\$ 12.521,60	R\$ 12.521,60	R\$ 12.521,60	R\$ 12.521,60
15	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 105.111,53	R\$ 8.755,79	R\$ 8.755,79	R\$ 8.755,79	R\$ 8.755,79	R\$ 8.755,79	R\$ 8.755,79	R\$ 8.755,79	R\$ 8.755,79	R\$ 8.755,79
		R\$ 2.718.265,82	R\$ 226.431,54	R\$ 226.431,54	R\$ 226.431,54	R\$ 226.431,54	R\$ 226.431,54	R\$ 226.431,54	R\$ 226.431,54	R\$ 226.431,54	R\$ 226.431,54
			R\$ 226.431,54	R\$ 452.883,08	R\$ 679.294,62	R\$ 905.726,16	R\$ 1.132.157,70	R\$ 1.358.689,24	R\$ 1.685.020,78	R\$ 1.811.452,32	R\$ 2.037.852,88



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE				DATA:	11/06/2024	BDI:	24,52%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE				FONTE:	VERSAO	HORA	MES
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE				ORSE	202309	111,93%	70,0%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE				SENTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
						SINAPI	202309 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
						Comp. e Impostos	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 10	MES 11	MES 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 222.066,67	R\$ 18.498,15	R\$ 18.498,15	R\$ 18.587,02	R\$ 222.066,67
2	COBERTURA METÁLICA	R\$ 773.476,70	R\$ 64.430,61	R\$ 64.430,61	R\$ 64.739,99	R\$ 773.476,70
3	COBERTURA VESTIÁRIO	R\$ 23.270,36	R\$ 1.938,42	R\$ 1.938,42	R\$ 1.947,74	R\$ 23.270,36
4	ARQUIBANCADAS	R\$ 228.907,14	R\$ 19.067,96	R\$ 19.067,96	R\$ 19.159,58	R\$ 228.907,14
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO-VESTIÁRIOS	R\$ 273.067,18	R\$ 22.746,50	R\$ 22.746,50	R\$ 22.855,68	R\$ 273.067,18
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 284.635,72	R\$ 23.710,16	R\$ 23.710,16	R\$ 23.823,96	R\$ 284.635,72
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 65.714,17	R\$ 5.473,99	R\$ 5.473,99	R\$ 5.500,28	R\$ 65.714,17
8	PISOS	R\$ 402.255,11	R\$ 33.507,85	R\$ 33.507,85	R\$ 33.668,76	R\$ 402.255,11
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 48.181,55	R\$ 4.013,52	R\$ 4.013,52	R\$ 4.032,83	R\$ 48.181,55
10	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 21.794,67	R\$ 1.815,50	R\$ 1.815,50	R\$ 1.824,17	R\$ 21.794,67
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 74.027,09	R\$ 6.166,46	R\$ 6.166,46	R\$ 6.166,03	R\$ 74.027,09
12	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-PCIP	R\$ 9.607,92	R\$ 800,34	R\$ 800,34	R\$ 804,18	R\$ 9.607,92
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-SPDA	R\$ 35.830,65	R\$ 2.984,69	R\$ 2.984,69	R\$ 2.999,06	R\$ 35.830,65
14	PINTURA	R\$ 150.319,36	R\$ 12.521,60	R\$ 12.521,60	R\$ 12.581,76	R\$ 150.319,36
15	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 105.111,53	R\$ 8.755,79	R\$ 8.755,79	R\$ 8.797,84	R\$ 105.111,53
		R\$ 2.718.265,82	R\$ 2.264.315,40	R\$ 2.490.746,94	R\$ 2.718.265,82	R\$ 2.718.265,82

CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES:123304 93304
 Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES:123304 93304
 FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA:8399 4629349
 Assinado de forma digital por FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA:8399 4629349



COMPOSIÇÃO DO BDI					
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA : 11/08/2024		BDI : 24,52%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE	2023/09	111,93%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB(DESONERADA)	4,50%
	TOTAL	10,15%



BDI = 24,52%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO
WILTON UCHOA
NOGUEIRA:83994629349

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
WILTON UCHOA
NOGUEIRA:83994629349

CARLOS
AUGUSTO
MORAIS
FERREIRA
GOMES:12330493304

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO MORAIS
FERREIRA
GOMES:12330493304

 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA : 11/08/2024		BDI : 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORSE	2023/09	111,53%	70,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,48%
			FINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,48%
		Contribuições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE		DATA : 11/06/2024		BDI : 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE		ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%		
		Campos de Pesquisa	PRÓPRIA	0,00%			



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	Rúbrica
A	GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
	TOTAL	16,80%	16,80%	


B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%	
B2	Feriados	3,71%	0,00%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	
	TOTAL	44,41%	16,46%	

C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	
	TOTAL	14,73%	11,38%	

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	
	TOTAL	7,91%	3,12%	

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA : 11/06/2024		BDI : 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MEG
			GRSE	2023/09	111,93%	70,07%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	48,75%
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

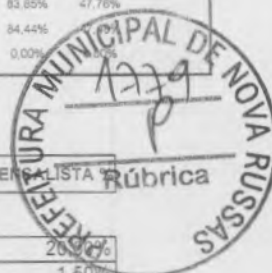

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,86%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,54%	17,11%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	12,41%	9,53%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	17,18%	6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%

FRANCISCO
WILTON UCHOA
NOGUEIRA:8399
4629349

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO WILTON
NOGUEIRA:8399462
9349

CARLOS
AUGUSTO
MORAIS FERREIRA
GOMES:12330493
304

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO MORAIS
FERREIRA
GOMES:123304933
04
